

教育部九二一災後校園重建報告目錄

章節名稱	頁碼
第一章、九二一重建歷程.....	1
第二章、教育部校園重建專案小組成員及工作職掌.....	6
第三章、教育部負責重建部分進度說明.....	7
第四章、地方政府及學校自辦、民間認養部分重建進度說明..	11
第五章、總結.....	17
附錄	
（A組）委託內政部營建署代辦重建組明細表.....	22
（B組）委託亞新顧問公司協辦重建組明細表.....	29
（C組）地方政府及學校自辦重建組明細表.....	33
（D組）民間認養自（委）辦重建組明細表.....	52

教育部九二一災後校園重建報告

第一章 九二一重建歷程

壹、九二一重建歷程

1. 成立教育部九二一震災危機小組 (88.9.21)
2. 協調中央災害防救中心協助搶救 (88.9.21)
3. 協調大學相關系所進行校舍結構安全鑑定 (88.9.24)
4. 呼籲各級學校及社會人士協助救災 (88.9.24)
5. 輔導災區學生至其他縣市學校寄讀 (88.9.27)
6. 確立預算可緩辦或可移緩濟急之原則 (88.9.28)
7. 調查受災縣市簡易教室及廁所需求數 (88.9.30)
8. 呼籲民間認養學校 (88.10~12)
(89年12月底止認養經費達95億，被認養單位負責重建校數達108所，其他為部分經費認捐)
9. 協調工程營建機構搭蓋簡易教室
(88.10~12)
10. 成立校園重建諮詢工作小組
(88.10.25)
11. 以未來五年學校發展規模提報校園重建經費 (88.10~11)
12. 遴選專案管理廠商協助學校重建
(89.2~5)
13. 行政院工程會核定校園重建經費
(89.3.21)
- 520 新政府接續重建工作
14. 重組災區校園重建會報 (89.5.27)


15. 推動新校園運動 (89.5.27)

16. 確立中央、地方政府、民間團體參與

學校重建之夥伴關係 (89.5.30) (重建經費未滿 5000 萬，得依縣市政府或學校意願自辦，5000 萬元以上或 5000 萬元以下但屬整校重建之工程，由教育部代為遴選建築師及專業管理廠商)

1. 確保安全、健康、舒適的無障礙環境。
2. 落實高效能且符合機能的教學環境
3. 營建可供社區終生學習及景觀地標之核心設施。
4. 依據校園整體規劃，推動校園重建工作。
5. 成立校園規劃重建小組，落實開放公共參與。
6. 建立校園與學區、社區資源之整合與共享模式。
7. 確保校園重建期間，學習與生活環境品質。
8. 永續發展的綠色校園環境。

17. 劃分成 A、B、C、D 四組，進行重建 (89.6)

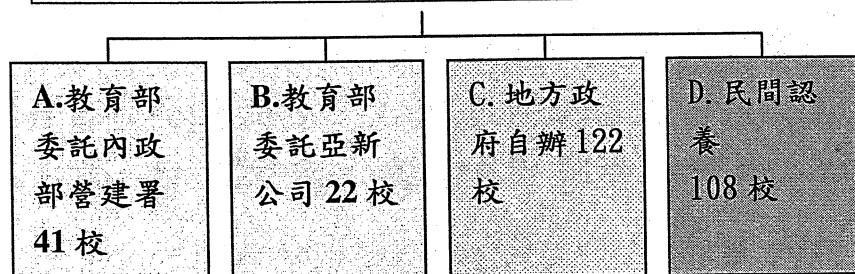

18. 確定營建署、亞新公司提供專業服務 (89.6)

19. 遠東建築獎第一屆「921 校園重建特別獎」(89.6~89.9)

20. 遴選優良建築師及廠商 (89.7~8)

21. 建築師/學校參與式規劃設計 (89.8~11)

22. 解決土壤液化、增設防空避難室、遷校土地取得、地上物拆除、水土保持等相關問題 (89.8~11)

23. 採行最有利標 (89.10~12)

24. 進行校園重建發包作業 (89.12~90.3)

25. 調整九二一校園重建專案小組 (90.2.20)

(遵照重建會會議決議將督導會報改組專案小組，將各相關機關納入小組成員)

26. 出版九二一重建統計要覽及進度控管雙週報 (90.3.1)
27. 請公共工程委員會協助勘察簡易教室之安全 (90.5~6)
28. 舉辦「921 校園重建—新校園運動階段成果展」
(90.5.11~6.10)
29. 行政院舉辦校園重建民間認養學校團體感謝會 (90.6.1)
30. 將「921 校園重建—新校園運動階段成果展」移至台中
自然科學博物館 (90.7.4~9.9)
31. 舉辦新校園運動「新校園、新教學」研討會(於台中自然
科學博物館) (90.8.13)
32. 舉辦「小班教學計劃」、「新校園建築規範觀摩」研討會(於
宜蘭)---延續新校園運動理念、達到綠建築、再生能源、
太陽能使用永續校園目標 (90.9 月-10 月)
33. 於 921 地震二週年出版「新校園運動」、「民間認養重建
學校」、「專案管理重建學校」、「籌建 921 地震教育園區」
等四冊成果專輯 (90.9.21)
34. 舉辦「921 地震二週年紀念特展」(於台中 921 地震教育
園區) (90.9.21-90.10.21)
35. 將「921 校園重建—新校園運動階段成果展」移至高雄
科學工藝博物館 (90.10.9~12.9)
36. 舉辦高中職、特教校長「新校園運動研習營」(90.11.29~30)
37. 遠東建築獎第二屆「921 校園重建特別獎」(90.6~90.11)
38. 配合重建會舉辦「校園重建成果試辦巡禮活動」一日遊
(91.1.5 起辦四梯次)

貳、重建學校數及分組

九二一災後校園重建，依其屬性計分為四組：

一、A 組教育部委託內政部營建署代辦重建部分 41 所學校。

二、B 組教育部委託亞新顧問公司協辦重建部分 22 所學校。

三、C 組地方政府自辦重建部分 122 所學校。

四、D 組民間認養自辦重建部分 108 所學校。

以上重建學校總計 293 所學校（如表 1）。

表-1 九二一校園重建學校數及分組統計表

九二一校園重建學校數及分組統計表		
辦理組	學校數	百分比
A.教育部委託 內政部營建署	41	13.9%
B.教育部委託 亞新顧問公司	22	7.5%
C. 地方政府 自辦	122	41.6%
D. 民間認養	108	36.8%
總計	293	分母

註：國立東勢高工、國立草屯商工重建工程係全面性重建，工程規模龐大、經費額度高。為重建出高品質校園，依據專案小組第二次、第六次及第十五次會議決議將兩校由原先 C 組(學校自辦)實質上委請內政部營建署 (A 組) 代辦。

參、重組九二一校園重建專案小組

教育部依據九十年二月十三日行政院重建委員會召開之「研商學校重建專案小組作業機制及運作事宜會議」，決議略以：


一、教育部所組成之學校重建專案小組不應僅限於處理營建署代辦重建學校問題，應包括所有學校重建問題(包括營建署代辦部分、亞新公司協辦部分、縣市政府及學校自辦部分、各界認養重建部分)。請教育部正式規劃該專案小組之組織及運作方式、工作內容、權責分工【參與單位考慮包括重建委員會、教育部各相關單位、行政院主計處、工程會、研考會、營建署、亞新公司、縣市政府等】，並由范政務次長擔任召集人。

二、請教育部編印「學校重建簡明統計要覽」及「進度控管雙週報」。

本部遵照將以往已召開二十一次之重建督導會報，重新分工，協請相關部會共同參與，組成九二一校園重建專案小組，明確組織架構，自九十年二月二十日起，固定每週一中午召開專案小組會議，針對相關困難問題加以協調解決。並自九十年三月一日起出版「學校重建簡明統計要覽」及「進度控管雙週報」。「學校重建簡明統計要覽」於九十年五月起由每週一出版之「921 災後校園重建報告」取代。

第二章 教育部校園重建專案小組成員及工作職掌

九二一震災校園重建專案小組組織架構圖【90.2.20】

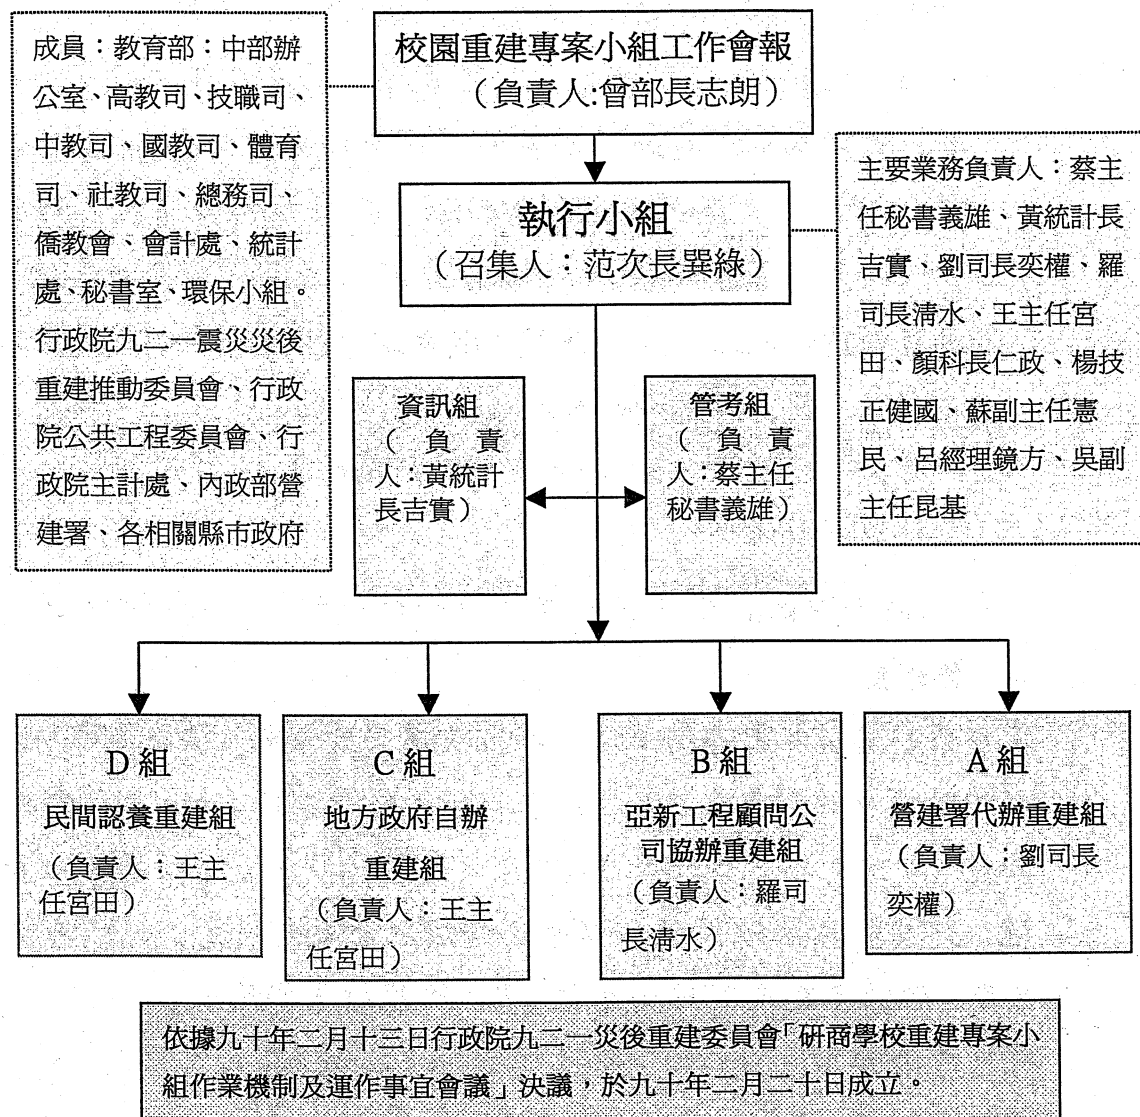

第三章 教育部負責重建部分進度說明

壹、背景說明

九二一校園重建，土地清楚、問題單純、無特殊障礙原因之受災學校，已由民間團體優先選擇認養，對於稍有困難之學校，亦必須由教育部出面承諾協助解決，民間團體才願意認養，剩餘困難度高、有特殊不易解決問題之重建學校，則由政府負責重建。本部相關同仁自震災以來，無不戮力投入，克服種種困難，九十年二月起成立專案小組，每週召開專案小組會議，推動新校園之重建，由於已完成階段性任務，自九十一年起，重建專案小組每兩週召開會議，針對未發包之3所學校，一一解決所面臨之問題，務期校園重建早日完成。

貳、教育部負責重建部分

教育部負責部分，包含教育部委託內政部營建署代辦重建的 41 所學校，以及委請民間亞新工程顧問公司協辦重建的 22 所學校，總計有 63 所學校（如表 2）。

表-2 九二一校園重建教育部負責部分（A、B 組）統計表

九二一校園重建教育部負責部分（A、B 組）統計表													
縣市別 組別	台北 縣	桃園 縣	苗栗 縣	台中 縣	南投 縣	彰化 縣	雲林 縣	嘉義 縣	台南 縣	台南 市	嘉義 市	高中 職	小計
A.教育 部委託 內政部 營建署	0	0	2	11	20	0	0	0	0	0	0	8	41
B.教育 部委託 亞新顧 問公司	0	0	0	0	0	0	6	5	2	2	5	2	22
小計	0	0	2	11	20	0	6	5	2	2	5	10	63

參、已竣工部分

一、內政部營建署代辦部分：

截至九十一年一月二十一日，已完工使用之學校有 30 校，
包括南投縣 17 校、台中縣 10 校、苗栗縣 1 校、高中職 2 校。

二、亞新公司委辦部分：

截至九十一年一月二十一日，已完工使用之學校有 21 校，
包括雲林縣 6 校、台南市 2 校、嘉義縣 5 校、嘉義市 4 校、
台南縣 2 校、高中職 2 校。

以上重建竣工學校總計 51 所學校（如表 3）。

表-3 九二一校園重建教育部負責部分竣工統計表

九二一校園重建教育部負責部分竣工統計表													
縣市別 組別	台北 縣	桃園 縣	苗栗 縣	台中 縣	南投 縣	彰化 縣	雲林 縣	嘉義 縣	台南 縣	台南 市	嘉義 市	高中 職	小計
A.教育 部委託 內政部 營建署	0	0	1	10	17	0	0	0	0	0	0	2	30
B.教育 部委託 亞新顧 問公司	0	0	0	0	0	0	6	5	2	2	4	2	21
小計	0	0	1	10	17	0	6	5	2	2	4	4	51

肆、已發包未竣工部分

至九十一年一月二十一日已完成發包之學校，計有內政部營建署代辦重建之 11 所學校，亞新工程顧問公司協辦重建的 1 所學校。總計完成發包之學校有 12 所，其中 9 所預訂於九十一年六月底前竣工，3 所則在九十一年年底前竣工（如表 4）。

表-4 九二一校園重建教育部負責部分發包統計表

組別	學校數	已竣工學校數	已完成發包學校數	尚未發包學校數	已發包預定 91 年 1 月竣工校數	已發包預定 91 年 2 月竣工校數	已發包預定 91 年 3 月竣工校數	已發包預定 91 年 4 月竣工校數	已發包預定 91 年 5 月竣工校數	已發包預定 91 年 6 月竣工校數	已發包預定 91 年 7 月後竣工校數
(A) 內政部營建署	41	30	11	0	3	2	0	1	1	1	3
(B) 亞新顧問公司	22	21	1	0	0	0	0	0	0	1	0
小計	63	51	12	0	3	2	0	1	1	2	3

第四章 地方政府自辦（C組）、民間認養（D組） 部分重建進度說明

壹、重建學校數

- 一、 地方政府自辦重建學校數計有 122 所（C 組），包括台北縣 1 校，桃園縣 1 校，苗栗縣 11 校，台中縣 8 校，南投縣 58 校，彰化縣 2 校，雲林縣 1 校，嘉義縣 25 校，台南縣 1 校，台中市 14 校。
- 二、 民間認養重建學校部分計有 108 校（D 組），包括民間團體認捐經費自辦或委由慈濟代建，其中南投縣 60 校，苗栗縣 3 校，雲林縣 7 校，嘉義市 1 校，嘉義縣 12 校，台中縣 25 校。

以上重建學校總計 230 所學校（如表 5）。

表-5 地方政府自辦及民間認養重建部分統計表

地方政府自辦及民間認養重建部分統計表													
縣市別 組別	台北 縣	桃園 縣	苗栗 縣	台中 縣	南投 縣	彰化 縣	雲林 縣	嘉義 縣	台南 縣	台中 市	嘉義 市	高中 職	小計
C. 地方 政府 自辦	1	1	11	8	58	2	1	25	1	14	0	0	122
D. 民間 認養	0	0	3	25	60	0	7	12	0	0	1	0	108
小計	1	1	14	33	118	2	8	37	1	14	1	0	230

貳、已竣工部分

一、地方政府自辦部分：

截至九十一年一月二十一日，已完工使用之學校有 102 校，包括南投縣 52 校，苗栗縣 6 校，台中縣 6 校、台中市 11 校，雲林縣 1 校、嘉義縣 22 校、彰化縣 2 校、台北縣 1 校、桃園縣 1 校。

二、民間認養重建部分：

截至九十一年一月二十一日，已完工使用之學校有 97 校，包括南投縣 55 校，苗栗縣 2 校，嘉義縣 12 校，嘉義市 1 校，台中縣 20 校，雲林縣 7 校。

以上重建竣工學校總計 199 所學校（如表 6）。

表-6 地方政府自辦（C 組）及民間認養（D 組）重建竣工統計表

地方政府自辦及民間認養（C、D）重建竣工統計表													
縣市別 組別	台北 縣	桃園 縣	苗栗 縣	台中 縣	南投 縣	彰化 縣	雲林 縣	嘉義 縣	台南 縣	台中 市	嘉義 市	高中 職	小計
C. 地方 政府 自辦	1	1	6	6	52	2	1	22	0	11	0	0	102
D. 民間 認養	0	0	2	20	55	0	7	12	0	0	1	0	97
小計	1	1	8	26	107	2	8	34	0	11	1	0	199

參、已發包未竣工部分

一、地方政府自辦部分：

截至九十一年一月二十一日，已發包施工中的學校有 17 校，其中有 17 校預定於九十一年六月底前竣工。

二、民間認養重建部分：

截至九十一年一月二十一日，已發包施工中的學校計 11 校；其中有 7 校預定於九十一年六月底前竣工，有 4 校則在九十一年年底前竣工。

以上已發包重建學校總計 28 所學校（如表 7）。

表-7 地方政府自辦、民間認養自（委）辦重建已發包統計表

組別	學校數	已竣工學校數	已完成發包學校數	尚未發包學校數	已發包預定 91 年 1 月竣工校數	已發包預定 91 年 2 月竣工校數	已發包預定 91 年 3 月竣工校數	已發包預定 91 年 4 月竣工校數	已發包預定 91 年 5 月竣工校數	已發包預定 91 年 6 月竣工校數	已發包預定 91 年 7 月後竣工校數
(C) 地方政府自辦	122	102	17	3	5	2	3	5	1	1	0
(D) 民間認養	108	97	11	0	2	2	2	0	0	1	4
小計	230	199	28	3	7	4	5	5	1	2	4

肆、未發包部分

一、地方政府自辦部分：

截至九十一年一月二十一日尚未完成發包之學校包括南投縣 2 校，嘉義縣 1 校，計 3 校。

以上未發包重建學校總計 3 所學校（如表 8）。

表-8 地方政府自辦及民間認養重建尚未發包校數統計表

地方政府、學校自辦及民間認養（C、D）重建尚未發包校數統計表					
縣市別 組別	台中縣	南投縣	嘉義縣	高中職	小計
(C)地方政府自辦	0	2	1	0	3
(D)民間認養	0	0	0	0	0
小計	0	2	1	0	3

伍、未完成發包之原因：

表-9 九二一校園重建各組未發包統計表

九二一校園重建各組未發包統計表					
辦理者	尚未發包校數	縣市別	學校名	原因	因應對策
(C) 地方政府自辦	3	南投縣	發祥國小	原係配合遷村，整體作業。	90.4經協調鄉公所同意已先覓校地，辦理基地測量，俟測量完成再行變更地目，並進行相關行政程序。縣政府於 90.12.4 辦理遴選顧問工程公司開標，辦理土地變更作業。
		嘉義縣	中崙國小	位於斷層帶，經專家評估不宜原地重建，另覓兩校地 4/23 經經濟部中央地質調查所亦函知不宜建校。	90.7.6 地方人士已提供兩塊校地，經縣政府完成地籍圖座標後送經濟部地質調查所進一步勘察有無斷層。結果確定位於斷層帶上。現已另為覓地，學生則暫時安置鄰近的沱水國小，並由縣府補助每月交通費及保險費。近期將召開重建工程相關事宜協商會議，協商是否於原校地搭建小木屋方式進行重建校舍，將邀請相關單位參加。

		南投縣	內湖國小	遷校預定用地為台大實驗林場，自 89.7.13 起協調台大（詳如附件歷程）。	重建會及教育部組成評選委員會，就有水坑、石公坪進行水保及環評作業評選優良廠商，已於 90.6.22 完成評選作業，7.2 與廠商完成議價。7.17 完成審查工作計劃書。因受桃芝颱風影響造成鹿谷鄉土石流嚴重，聯外道路中斷，因此該公司延至 9.7 提期中報告，並已於 9.14 召開審查會。初步已決議排除有水坑基地設校之可行性，並將針對石公坪基地未來安全開發範圍於期末報告一併列入評估。該公司已於 10.8 送期末報告，10.16 召開審查會，中辦已於 11.13 行文東昇公司要求俟其完成定稿後於 11.26 前送國教司。重建會與教育部於 90.12.3 召開遷校評估會議後，決議請縣政府同步進行有關石公坪環評、水保及都市計劃變更作業之評估及考量另覓更佳之設校基地。
--	--	-----	------	--	--

第五章 總 結

壹、彙總

九二一校園重建整體而言，目前：

- 一、已竣工學校數為 250 所。
- 二、已完成發包學校數為 40 所，尚未發包學校數 3 所。
- 三、已完成發包預定 91 年 6 月竣工學校數 33 所。
- 四、已完成發包預定 91 年底前竣工學校數 7 所。
- 五、隨著加速發包的進行，竣工學校校數將會持續增加，表內竣工學校數百分比也會隨時聯動調整（如表 10）。
- 六、尚未發包之 3 所學校，其中南投縣內湖國小縣政府刻正進行土地環境、水保及都市計畫變更作業評估、發祥國小縣政府正遴選顧問公司及辦理土地變更、而中崙國小嘉義縣政府刻正研擬折衷方式以克服校地位於斷層帶問題，3 校均正積極協調處理中。

表-10 九二一校園重建總統計表

組別	學校數	已竣工學校數	已完 成發包學校數	尚未發包學校數	已發包預定91年1月竣工校數	已發包預定91年2月竣工校數	已發包預定91年3月竣工校數	已發包預定91年4月竣工校數	已發包預定91年5月竣工校數	已發包預定91年6月竣工校數	已發包預定91年7月後竣工校數
(A) 內政部營建署	41	30	11	0	3	2	0	1	1	1	3
(B) 亞新顧問公司	22	21	1	0	0	0	0	0	0	1	0
(C) 地方政府自辦	122	102	17	3	5	2	3	5	1	1	0
(D) 民間認養	108	97	11	0	2	2	2	0	0	1	4
總計	293	250	40	3	10	6	5	6	2	4	7
	分母	85.3 %	13.7 %	1.0 %							
竣工校數累計及百分比		250			260	290					
		85.3 %			88.7 %	98.9 %					

註1：國立東勢高工、國立草屯商工重建工程係全面性重建，工程規模龐大、經費額度高。為重建出高品質校園，依據專案小組第二次、第六次及第十五次會議決議將兩校由原先C組(學校自辦)實質上委請內政部營建署(A組)代辦。

註2：A組南投縣新山國小原為90年9月竣工，現因桃芝颱風受損嚴重，已無限期停工，基於安全考量，將由營建署函請縣政府儘速決定確定處理方式，因此暫時將其計列於91年7月後竣工校數。

貳、有關請求各部會及縣市政府協助協調解決事項

- 一、目前各校校園重建工作，核發建照、使用執照；有關消防、水土保持、環境評估、建管、水電等手續，目前在相關縣市政府及中央主管機關全力協助配合下，配合重建進度之完成正積極進行中。
- 二、校園重建由縣市政府自辦者（C組），由學校及縣市政府負責第一線之工程品質要求，教育部中部辦公室作第二線之工程品質監督，教育部再協請行政院九二一災後重建委員會、行政院公共工程委員會、內政部營建署協助 124 所學校之全面工程品質管控，共同推動全面三級品管，提供專業之協助及監督。依據本部「九二一震災受災學校校園重建專案小組」第三十次會議紀錄決議，本部中部辦公室與行政院重建會針對 C、D 組尚未完工學校，組成施工品質訪評工作小組，分別於九十年十一月十九、廿、廿一、廿三日訪評苗栗縣永興國小；台中縣東勢國中、坪林國小、太平國中、塗城國小、健民國小、僑榮國小、光復國中；台中市雙十國中、崇倫國中；南投縣和雅國小、南投國中、國姓國中、大成國小、中峰國小、桃源國小；嘉義縣來吉國小、豐山國小、太興國小；嘉義市垂楊國小等二十所重建學校及一所嘉義市復國幼稚園。並已將訪評結果函知各縣市政府轉知工程主辦機關檢討各項缺失，並提出改善計畫，責成監造單位及承包廠商限期改善。
- 三、行政院公共工程委員會於九十年十月份至十二月份辦理第二屆公共工程金質獎，校園重建 A 組（委請營建署專案管理）台中縣土牛國小，榮獲小型工程類金質獎，主要事實為：契約金額 0.62 億元，工程工期 172 日曆天（90.3.26~90.9.21），由內政部營建署辦理專案管理，於最短期間內完成校園重建，使學生於最短期間內離開簡易教室，施工期間勞工安全及環保局維護零事故，施工過程學校、家長、社區積極參與配合，落實敦親睦鄰，獲得社區民眾一致贊賞。

參、結語

教育部 921 災後重建工程中，以「新校園運動」做為推動教育改革，創造嶄新學習環境的核心精神，以期能夠與優秀的建築專業者結合，在學校重建過程中，由學校師生、社區、家長共同參與，以使學校重建完成後能成為當地的社區活動中心、地方文化的重鎮與城鄉交流的核心；此一理念不僅將許多教育改革的新思考，擴展為教育重建的一環；更以地方的教育重建，帶動在地社區的重建，豐富了災區重建實質內涵。

我們相信，校園環境本身就是教育活動的一環，一個設計良好、人性化的校園，更是能夠完整傳達出我們對於教育改革理想——舉凡人本教育、開放教育、小班小校、終身學習、校園開放、綠色學校等核心精神，都應該是涵括在我們的校園環境當中，並且成為落實我們教改理念重要的環節。

因此，在這次大地震後的重建工作中，讓孩子們及早重新回到學校固然是教育單位責無旁貸的責任，但我們更希望可以給他們一個全新的校園——讓我們將這個兩百多所校園環境重建的過程，凝聚為台灣新一波教育改革觸角更廣、向下深耕的成長茁壯力量。這些是我們的「新校園運動」所致力完成的目標。

為了達成這些理想，教育部在重建過程中不僅協助學校遴選建築師及評選專業營建管理顧問公司，提供專業服務，以協助校園重建工作，頗獲建築師、學校、及工程業界之好評。而為了確保工程施工品質，教育部亦與重建會、公共工程委員會共同推動採行「最有利標」的方式發包，以期我們點點滴滴的努力，都可以在優質、專業的施工管理過程中，逐步實現。

校園重建工作推展至今，舉凡遴選建築師、規劃設計、

審查預算圖說、上網公告、招標、動土、竣工等各項作業流程，許多困難之問題也一一處理獲得解決，教育部目前除落實督導機制，加速推動校園重建以儘速完成為目標，俾社會大眾均能參與同享校園重建成長的喜悅，也加強對社會大眾之宣導，讓民眾對教育部校園重建工作有更清楚的認識。

校園重建工作係新舊政府八十九年五月二十日交接時，共同的想法及願景，對於如何掌握重建契機，妥善進行校園規劃的工作，有著同樣堅持的教育改革理念，新政府接手後，第一件事，便是為災後重建工作定下基本明確的運作方向，校園重建工作在此之後更如火如荼，加速進行，承蒙社會各界的關心，給予許多的協助及支持，使得校園重建工作得以落實推動，目前已完成將近九成，在此謹代表教育部感謝社會各界之關切及協助之熱忱，並懇請一秉初衷，繼續給予協助和指導。

表-11 委由營建署代辦重建部分明細表

九二一校園重建教育部委辦部分							
(A 組) 委託內政部營建署代辦重建組							
編號	縣市鄉鎮	學校名稱	竣工與否		發包與否		建築師、營造廠商、已(預定)發包、竣工日或因應對策
			是	否	是	否	
1	南投縣 南投市	營盤國小	✓				90.1.17 決標 龔瑞琦建築師事務所、寶祥營造 90.1.17 發包、 90.8.11 竣工
2	南投縣 埔里鎮	宏仁國中			✓		90.2.9 流標 90.2.27 決標 黃建興建築師事務所、新亞建設 90.2.27 發包、預定 91.1.31 竣工
3		育英國小			✓		90.2.20 決標 大藏聯合建築師事務所、啟阜營造 90.2.20 發包、預定 91.2.5 竣工
4		水尾國小	✓				90.1.31 流標 90.2.13 決標 日本株式會社象設計集團、益進營造 90.2.13 發包、 90.10.25 竣工
5		南光國小	✓				90.1.10 流標 90.2.16 決標 李俊仁建築師事務所、新亞建設 90.2.16 發包、 91.1.9 竣工
6	南投縣	富功國小	✓				90.1.11 決標 黃志瑞建築師事務所

	草屯鎮		✓					所、寶祥營造 90.1.11 發包、 90.7.30 竣工
7		土城國小	✓				90.1.10 決標	龔瑞琦建築師事務所、永祥營造 90.1.10 發包、 90.7.20 竣工
8	南投縣 竹山鎮	瑞竹國中	✓				90.1.05 流標 90.2.02 流標 90.2.16 決標	王立甫建築師事務所、鄉林營造 90.2.16 發包、 90.9.28 竣工
9		延和國中	✓				90.1.4 廢標 90.2.09 決標	劉木賢建築師事務所、長家營造 90.2.9 發包、90.9.16 竣工
10	南投縣 中寮鄉	廣英國小	✓				90.1.17 決標	黃永健建築師事務所、季宏營造 90.1.17 發包、 90.8.28 竣工
11	南投縣 國姓鄉	南港國小	✓				89.12.28 流標 90.1.09 流標 90.1.30 決標	黃永健建築師事務所、力豐營造 90.1.30 發包、 90.10.16 竣工
12	南投縣 鹿谷鄉	鹿谷國中	✓				90.1.17 決標	王立甫建築師事務所、和暉營造 90.1.17 發包、 90.8.30 竣工
13	南投縣 水里鄉	民國國中	✓				90.1.20 流標 90.2.13 決標	陳淑芬建築師事務所、永青營造

							90.2.13 發包、 90.10.16 竣工
14		民和國小	✓			90.1.20 流標 90.2.13 決標	陳淑芬建築師事務所、永青營造 90.2.13 發包、 90.10.16 竣工
15		新山國小			✓	90.2.09 流標 90.2.27 決標	黃建興建築師事務所因桃芝颱風受損嚴重，為安全考量，已全面停工。 (原係 90.9 完工)
16		郡坑國小	✓			90.1.05 廢標 90.2.09 流標 90.2.27 決標	黃建興建築師事務所、新亞建設 90.2.27 發包、 90.12.15 竣工
17		成城國小	✓			90.1.4 流標 90.1.19 流標 90.3.06 決標	蔣敬三建築師事務所、向陽營造 90.3.6 發包、91.1.8 竣工
18	南投縣 信義鄉	隆華國小	✓			89.12.19 流標 90.1.05 議價不成 90.1.12 決標	蔣敬三建築師事務所、宗聖營造 90.1.12 發包、 90.11.30 竣工
19	南投縣 仁愛鄉	親愛國小	✓			90.1.17 流標 90.2.07 決標	姜樂靜建築師事務所、欣祥營造 90.2.7 發包、90.11.22 竣工
20		仁愛國中	✓			90.2.13 決標	姜樂靜建築師事務所、欣祥營造

							90.2.13 發包、 90.11.13 竣工
21	台中縣 新社鄉	大林國小	✓			90.1.05 流標 90.2.02 決標	莊學能建築師事務所、季宏營造 90.2.02 發包、90.9.5 竣工
22	台中縣 和平鄉	中坑國小	✓			89.12.29 流標 90.1.12 決標	楊瑞禎建築師事務所、永祥營造 90.1.12 發包、 90.7.28 竣工
23	台中縣 太平市	黃竹國小	✓			90.1.05 廢標 90.1.19, 決標	莊學能建築師事務所、永祥營造 90.1.19 發包、 90.8.17 竣工
24		車籠埔 幼兒學校	✓			90.3.06 決標	王泰貴建築師事務所、義峰營造 90.3.6 發包、90.10.30 竣工
25	台中縣 霧峰鄉	霧峰國中	✓			90.1.11 流標 90.2.9 流標 90.2.27 決標	九典聯合建築師事務所、昭雄營造 90.2.27 發包、 90.12.2 竣工
26	台中縣 大里市	草湖國小	✓			90.1.04 流標 90.2.13 決標	十方聯合建築師事務所、龍台營造 90.2.13 發包、 90.10.30 竣工
27	台中縣 石岡鄉	土牛國小	✓			90.2.07 流標 90.2.20 決標	日本株式會社象設計集團、益進營造

							90.2.20 發包、 90.9.21 竣工
28	苗栗縣 三義鄉	僑成國小	✓			90.3.06 決標	李謝嵐建築師事務所、志勤營造 90.3.6 發包、90.11.18 竣工
29	南投縣 南投市	中興高中			✓	90.2.09 決標	林昭喜建築師事務所、義峰營造 90.2.9 發包、預定 91.1.23 竣工
30	南投縣 南投市	南投高中	✓			90.2.20 決標	境向聯合建築師事務所、興亞營造 90.2.20 發包、91.1.8 竣工
31	台中縣 新社鄉	新社中學	✓			90.1.09 廢標 90.1.30 廢標 90.4.09 決標	呂欽文建築師事務所、義峰營造 90.3.13 發包、90.12.21 竣工
32	台中縣 太平市	光隆國小			✓	90.2.09 流標 90.3.14 流標 90.3.27 決標	楊瑞禎建築師事務所、麗明營造 90.3.27 發包、預定 91.2.3 竣工
33	南投縣 南投市	南投高商			✓	90.1.19 流標 90.2.09 流標 90.3.15 決標	境向聯合建築師事務所、環宇營造 90.3.15 發包、預定 91.1.25 竣工
34	南投縣 竹山鎮	竹山高中			✓	90.3.27 決標	黃振東建築師事務所、一品營造 90.3.27 發包、預定

							91.6.4 竣工
35	台中縣 和平鄉	福民國小	✓			90.1.05 流標 90.2.02 流標 90.2.16 流標 90.2.23 流標 90.3.27 流標 90.4.10 決標	楊瑞禎建築師事務所、明文營造 90.4.10 發包、 90.11.22 竣工。
36	台中縣 大肚鄉	大道國中	✓			90.1.18 流標 90.2.12 流標 90.2.27 流標 90.4.10 決標	楊書河建築師事務所、勝緯營造 90.4.10 發包、 90.12.16 竣工
37	苗栗縣 竹南鎮	海口國小			✓	90.4.27 決標	周子艾建築師事務所、金富榮營造 90.4.27 發包、預定 91.4.6 教室先竣工，91.5.27 整體設施竣工
38	南投縣 埔里鎮	埔里高中	✓			90.4.25 決標	喻肇川建築師事務所、承隆營造 90.4.25 發包、 91.1.19 竣工
39	台中縣 霧峰鄉	霧峰農工			✓	90.4.17 決標	原相建築師事務所、義峰營造 90.4.17 發包、預定 91.1.13 先完成農機大樓， 使學生回到教室上課，整體設施景觀 預定 91.4.29 竣工
40	台中縣 東勢鎮	東勢高工			✓	因辦理遷校， 校地取得所需 行政流程長，	由教育部負責遴選 建築師，已 90.5.26 評選，90.6.7 簽

40	台中縣 東勢鎮	東勢高工			✓	因辦理遷校，校地取得所需 行政流程長，及全校重建經費約需 8.6 億元。	由教育部負責遴選建築師，已 90.5.26 評選，90.6.7 簽約。90.12.26 開標發包，預計 91.12.31 竣工。
41	南投縣	草屯商工			✓	因辦理遷校，校地取得所需 行政流程長，全校重建經費 6.9 億元。	由教育部遴選建築師 90.5.4 上網公告 90.6.6 開標 90.6.7 評選，90.6.28 簽約、90.12.13 發包，預計 91.12.31 竣工。
		合計	30		11 0		

註 1：國立東勢高工、國立草屯商工重建工程係全面性重建，工程規模龐大、經費額度高。為重建出高品質校園，依據專案小組第二次、第六次及第十五次會議決議將兩校由原先 C 組(學校自辦)實質上委請內政部營建署(A 組)代辦。

表-12 委由亞新工程顧問公司協辦重建部分明細表

九二一校園重建教育部委辦部分								
(B組) 委由亞新工程顧問公司協辦重建組								
編號	縣市鄉鎮	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
1	雲林縣	水林國中	✓				89.11.30 決標	林木榮建築師事務所、薪光真營造 89.11.30 發包 90.7.30 竣工
2		斗六國中	✓				90.1.30 決標	林承祺建築師事務所、興昌營造 90.1.30 發包 90.10.20 竣工
3		石榴國中	✓				89.12.20 決標	郭俊沛建築師事務所、明信營造 89.12.20 發包 90.8.20 竣工
4		淵明代用國中	✓				89.12.15 決標	莊季森建築師事務所、正任營造、三玄營造 89.12.15 發包 90.10.31 竣工
5		華山國小	✓				89.11.10 決標	馮子石建築師事務所、冠威營造 89.11.10 發包 90.5.30 竣工
6		臺興國小	✓				89.11.14 決標	莊季森建築師事

							90.8.20 竣工
7	嘉義縣	民雄農工	✓			89.12.20 決標	可文玉建築師事務所、川發營造 89.12.20 發包 90.7.20 竣工
8		竹崎國中	✓			89.12.29 流標 90.1.15 決標	王鏡偉建築師事務所、日升鴻營造 90.1.15 發包 90.7.19 竣工
9		民雄國小	✓			89.12.15 發標 89.12.30 決標	吳毓昌建築師事務所、金豐營造 89.12.30 發包 90.8.31 竣工
10		秀林國小	✓			90.1.31 流標 90.2.14 流標 90.2.23 決標	張弘昌建築師事務所、尚格工程營造 90.2.23 發包 90.12.31 竣工
11		和睦國小	✓			89.12.14 廢標 89.12.30 流標 90.1.8 決標	陳兆璋建築師事務所、勝偉營造 90.1.8 發包 90.9.29 竣工
12	台南縣	新化國中	✓			90.1.4 流標 90.1.30 流標 90.2.22 決標	蘇志文建築師事務所、名億營造 90.2.22 發包 90.12.31 竣工

13		南新國中	✓				89.12.14 決標	林大俊建築師事務所、和暉營造 89.12.14 發包 90.8.30 竣工
14	嘉義市	嘉義高中	✓				89.12.15 流標 89.12.28 流標 90.1.3 決標	陳資雲建築師事務所、川發營造 90.1.3 發包 90.10.5 竣工
15		北興國中	✓				89.12.28 決標	陳兆璋建築師事務所、祐鎮營造 89.12.28 發包 90.10.15 竣工
16		嘉義國中	✓				90.1.20 決標	侯慶豐建築師事務所、統盛營造 90.1.20 發包 91.1.20 竣工
17		博愛國小	✓				89.12.28 決標	吳德揚建築師事務所、松暉營造 89.12.28 發包 90.11.30 竣工
18		垂楊國小	✓				90.1.3 決標	張仁權建築師事務所、金豐營造 90.1.3 發包 90.11.15 竣工
19		嘉北國小	✓				90.1.4 決標	黃德介建築師事務所、協建成營造 90.1.4 發包 90.12.3 竣工

20	台南市	日新國小	✓				89.12.6 廢標 89.12.28 決標	石昭永建築師事務所、成大營造 89.12.28 發包 90.7.30 竣工
21		新南國小	✓				89.12.5 廢標 89.12.28 決標	劉木賢建築師事務所、旺盛營造 89.12.28 發包 90.7.30 竣工
22	嘉義縣 梅山鄉	梅山國中			✓		90.6.22 決標	蔡明宏建築師事務所、鼎上營造 90.6.22 發包預計 91.6.30 竣工
		合計	21		1	0		

表-13 地方政府及學校自辦重建部分明細表

九二一校園重建							
(C 組) 地方政府及學校自辦重建組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
1	台北縣	中正國小	✓				89.7.11 決標 吳建忠、黃正銅 建築師；國記營 造 89.7.11 發包 90.8.31 竣工
2	桃園縣	會稽國小	✓				89.11.7 流標 89.11.21 流標 89.12.1 保留 決標 89.12.16 核准 決標 陳福焜建築 師；富莊營造 89.12.16 發包 90.8.31 竣工
3	苗栗縣	獅潭國中			✓		89.12.28 流標 90.1.16 流標 90.4.11 決標 陳賢秋建築 師；華勝營造 90.4.11 發包 91.1.31 竣工
4		僑育國小			✓		90.1.3 流標 90.1.16 決標 李振裕建築 師；聯翔營造 90.1.3 發包 91.4.30 竣工
5		啟文國小			✓		89.12.29 流標 90.1.15 流標 90.3.1 流標 90.3.27 決標 陳賢秋建築 師；冠翔營造 90.3.27 發包 91.4.30 竣工
6		銅鑼國小			✓		89.12.29 流標 90.1.15 流標 90.3.1 流標 90.3.20 決標 陳賢秋建築 師；互利營造 90.3.20 發包 91.4. 竣工
7		田美國小	✓				89.7.25 決標 蕭孟郎建築 師；國欣土木營 造 89.7.25 發包 89.8.30 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
8		大湖國小	✓				89.10.31 流標 89.11.14 決標	余學強建築師；徵信營造 89.11.14 發包 90.8.30 竣工
9		大南國小	✓				89.11.28 流標 89.12.13 決標	劉志鵬建築師；陸順營造 89.12.13 發包 90.9.24 竣工
10		永興國小			✓		90.6.20 決標	劉志鵬建築師；互利營造 90.6.20 發包 91.4.30 竣工
11		雙連國小	✓				89.9.15 決標	黃麗敏建築師；合誠土木營造 89.9.15 發包 89.11.30 竣工
12		景山國小	✓				89.12.22 流標 90.1.9 決標	陳朝舜建築師；錦泰營造 90.1.9 發包 90.9.10 竣工
13		士林國小	✓				89.12.27 決標	湯明勳建築師；正怡營造 89.12.27 發包 90.10.1 竣工
14	台中縣	和平國中	✓				89.9.18 決標	蘇成基建築師；弘城營造 89.9.18 發包 90.3.10 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
15		東興國小			✓		89.9.15 流標 89.9.26 流標 89.10.25 流標 89.11.18 決標	范達榕建築師；王記營造 89.11.18 發包 91.2.10 竣工
16		大南國小	✓				89.9.15 決標	李永崇建築師；大將作營造 89.9.15 發包 90.11.12 竣工
17		崑山國小	✓				89.9.15 決標	邱金印建築師；基源營造 89.9.15 發包 90.9.15 竣工
18		坪林國小			✓		89.9.15 決標	賴志信建築師；永聯營造 89.9.15 發包 91.4.1 竣工
19		東汴國小	✓				89.9.15 決標	羅榮源建築師；鄉禹營造 89.9.15 發包 90.3.19 竣工
20		博愛國小 谷關分校	✓				90.3.21 決標	賴志信建築師；洪揚營造 90.3.21 發包 90.10.12 竣工
21		自由國小	✓				解除列管	林聰德建築師；塔城營造 行政院於 90.7.25 核定教室部分整修補強業已完工。

九二一校園重建							
(C組) 地方政府及學校自辦重建組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
22	彰化縣	民生國小	✓				89.12.29 決標 粘怡君建築師；富雄營造 89.12.29 發包 90.10.31 竣工
23		青山國小	✓				89.10.12 決標 張見識建築師；承府營造 89.10.12 發包 90.7.17 竣工
24	南投縣	南崗國中			✓		89.12.22 流標 90.02.09 流標 90.04.13 決標 呂孟勳建築師；友臣營造 90.4.13 發包 91.3.31 竣工
25		草屯國中	✓				89.12.30 決標 郭俊沛建築師；通義營造 89.12.30 發包 90.10.30 竣工
26		竹山國中	✓				89.12.28 流標 90.2.5 決標 賴榮俊建築師；連春營造 90.2.5 發包 90.9.7 竣工
27		魚池國中	✓				89.11.01 流標 89.12.12 決標 謝其安建築師；睿鵬營造 89.12.12 發包 90.5.28 竣工
28		明潭國中	✓				89.11.14 決標 賴榮俊建築師；合磊營造 89.11.14 發包 90.7.16 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
29		北山國中	✓				89.12.22 流標 90.1.30 流標 90.2.7 決標	陳永霖建築師；彰億營造 90.2.7 發包 90.12.21 竣工
30		同富國中	✓				89.12.22 流標 90.1.19 決標	陳永霖建築師；友臣營造 90.1.19 發包 90.10.15 竣工
31		光榮國小	✓				89.12.30 流標 90.2.9 決標	林昭喜建築師；裕建營造 90.2.9 發包 90.8.30 竣工
32		文山國小	✓				89.10.6 決標	黃文清建築師；久福土木營造 89.10.6 發包 89.12 竣工
33		僑建國小	✓				89.12.27 流標 90.1.30 決標	林景源建築師；顯昌營造 90.1.30 發包 90.8.31 竣工
34		光復國小	✓				89.12.30 決標	龔瑞琦建築師；通義營造 89.12.30 發包 90.9.7 竣工
35		千秋國小	✓				90.2.2 決標	龔瑞琦建築師；彰億營造 90.2.2 發包 90.9.30 竣工

九二一校園重建							
(C組) 地方政府及學校自辦重建組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
36	南投縣	史港國小	✓				90.4.13 決標 劉顯彰建築師；林慶營造 90.4.13 發包 90.10.22 竣工
37		溪南國小	✓				89.12.29 流標 90.2.21 流標 90.3.30 決標 林景源建築師；裕建營造 90.3.30 發包 90.10.31 竣工
38		麒麟國小	✓				89.12.30 流標 90.2.7 決標 伍開誠建築師；康柏營造 90.2.7 發包 90.8.15 竣工
39		鐘靈國小	✓				90.2.16 決標 賴榮俊建築師；天隆營造 90.2.16 發包 90.10.19 竣工
40		大鞍國小	✓				89.10.20 流標 89.11.7 流標 90.4.3 決標 陳文正建築師；拓全營造 90.4.3 發包 90.10.29 竣工
41		瑞竹國小	✓				89.9.11 決標 陳文正建築師；成屋土木營造 89.9.11 發包 90.2 竣工
42		秀林國小	✓				89.12.27 決標 文彬建築師事務所；杉源營造 89.12.27 發包 90.9.18 竣工
43		雲林國小	✓				89.11.17 決標 陳文正建築師；民祥營造 89.11.17 發包 90.4.16 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
44		鯉魚國小	✓				89.1.12 流標 90.2.7 決標	蔡鳳榮建築師；鄉林營造 90.2.7 發包 90.8.20 竣工
45		桶頭國小	✓				89.12.28 流標 90.2.7 決標	陳昇章建築師；億立營造 90.2.7 發包 90.8.1 竣工
46		隘寮國小	✓				89.12.28 流標 90.1.30 流標 90.2.13 決標	林勇志建築師；億立營造 90.2.13 發包 90.9.10 竣工
47		和平國小	✓				89.11.1 流標 89.11.17 決標	劉進忠建築師；大鑫土木營造 89.11.17 發包 90.3 竣工
48		田豐國小	✓				89.9.26 決標	建築師；中投營造 89.9.26 發包 89.10 竣工
49	南投縣	秀峰國小	✓				89.12.16 決標	莊敬三建築師；景麗營造 89.12.16 發包 90.6.25 竣工
50		文昌國小	✓				89.12.27 流標 90.1.30 決標	賴榮俊建築師；連春營造 90.1.30 發包 90.9.12 竣工

九二一校園重建

(C組) 地方政府及學校自辦重建組

編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
51		內湖國小				✓	遷校預定用地為台大實驗林場，自 89.7.13 起協調台大(詳如附錄歷程)。	重建會及教育部組成評選委員會，就有水坑、石公坪進行水保及環評作業評選優良廠商，已於 90.6.22 完成評選作業，7.2 與廠商完成議價。7.17 完成審查工作計劃書。9.7 提期中報告，並已於 9.14 召開審查會。初步已決議針對石公坪基地未來安全開發範圍於期末報告列入評估。該公司於 10.8 送期末報告，10.16 召開審查會，90.12.3 召開遷校評估會議後，決議請縣政府同步進行有關石公坪環評、水保及都市計劃變更作業之評估及考量另覓更佳之設校基地。

九二一校園重建							
(C組) 地方政府及學校自辦重建組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
52		初鄉國小	✓				89.11.17 決標 陳文正建築師；弘昌土木營造 89.11.17 發包 90.7.17 竣工
53		和雅國小			✓		89.12.28 流標 90.2.16 決標 莊展華建築師；立佳營造 90.2.16 發包 91.6.30 竣工
54		廣興國小	✓				89.12.22 流標 90.2.13 決標 山川尚建築師；太一營造 90.2.13 發包 90.12.8 竣工
55		永康國小	✓				89.12.29 決標 楊適槐建築師；鉅輝營造 89.12.29 發包 90.6.23 竣工
56		清水國小	✓				90.2.23 決標 謝伯昌建築師；欣民營造 90.2.23 發包 90.9.25 竣工
57		和興國小	✓				90.2.2 決標 林傳諒建築師；連春營造 90.2.2 發包 90.8.20 竣工
58		頭社國小	✓				89.11.1 決標 黃舜澤建築師；龍貓營造 89.11.1 發包 90.6.26 竣工
59		新城國小	✓				89.12.22 流標 90.1.30 決標 許學禮建築師；雙安土木營造 90.1.30 發包 90.6.15 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
60		德化國小	✓				89.11.15 決標	長億建築師事務所；福邑營造 89.11.15 發包 89.12.25 竣工
61	南投縣	共和國小	✓				89.12.28 流標 90.1.30 決標	莊建德建築師；康柏營造 90.1.30 發包 90.8.31 竣工
62		港源國小	✓				89.12.29 流標 90.2.13 決標	楊書河建築師；彰億營造 90.2.13 發包 90.10.26 竣工
63		車埕國小	✓				89.10.12 決標	郭耀章、郭俊沛建築師；漢邦營造 89.10.12 發包 90.3.30 竣工
64		羅娜國小	✓				89.11.24 決標	劉進忠建築師；成福營造 89.11.24 發包 90.5.30 竣工
65		同富國小	✓				89.10.20 決標	劉進忠建築師；成福營造 89.10.20 發包 90.2.15 竣工
66		愛國國小	✓				89.11.17 決標	曾國樑建築師事務所；傑將、昱盈營造 89.11.17 發包 90.2.15 竣工

九二一校園重建								
(C 組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
67		神木國小	✓				89.12.30 流標 90.1.30 流標 90.4.17 決標	賴衡堃建築師；瑄諭營造 90.4.17 發包 90.10.30 竣工
68		忠信國小	✓				89.11.17 決標	吳瑞楨建築師；成福營造 89.11.17 發包 90.2.25 竣工
69		久美國小	✓				89.11.7 流標 89.12.29 決標	姜樂靜建築師；佶璟、東陽營造 89.12.29 發包 90.5.30 竣工
70		雙龍國小	✓				89.11.23 決標	陳文正建築師；景一營造 89.11.23 發包 90.3.9 竣工
71		豐丘國小	✓				89.8.31 決標	劉進忠建築師；佶璟營造 89.8.31 發包 89.11.3 竣工
72		法治國小	✓				89.12.30 決標	吳柏緯建築師；東岳營造 89.12.30 發包 90.11.12 竣工
73		互助國小	✓				89.12.22 流標 90.1.30 決標	吳柏緯建築師；郡峰營造 90.1.30 發包 90.11.8 竣工

九二一校園重建							
(C 組) 地方政府及學校自辦重建組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
74		力行國小	✓				89.12.29 決標 吳省三建築師；上慶營造 89.12.29 發包 90.7.29 竣工
75		南豐國小	✓				89.11.28 決標 孟繁宏建築師事務所；康柏營造 89.11.28 發包 90.4.28 竣工
76	南投縣	中正國小			✓		89.12.15 流標 89.12.29 流標 90.4.13 決標 曾國樑建築師；營造 90.4.13 發包 91.1.30 竣工
77		發祥國小				✓	原係配合遷村，整體作業 90.4 經協調鄉公所同意已先覓校地，辦理基地測量，俟測量完成再行變更地目，並進行相關行政程序。縣政府於 90.12.4 辦理遴選顧問工程公司開標，辦理土地變更作業。
78		平靜國小	✓				89.12.28 流標 90.1.30 決標 莊建德建築師；康柏營造 90.1.30 發包 90.8.15 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
79		春陽國小	✓				89.11.28 流標 89.12.16 決標	林昭喜建築師；德鑫營造 89.12.16 發包 90.6.24 竣工
80		紅葉國小			✓		89.12.30 流標 90.2.2 流標 90.4.3 決標	莊建德建築師；高邦營造 90.4.3 發包 91.1.31 竣工
81		清境國小	✓				89.12.29 流標 90.1.30 流標 90.3.9 決標	梁守成建築師；康柏營造 90.3.9 發包 90.8.18 竣工
82	雲林縣	草嶺國小	✓				89.10.12 決標	馮子石建築師；鄉林營造 89.10.12 發包 90.2.28 竣工
83	嘉義縣	民雄國中	✓				89.12.12 決標	翁壽生建築師；瑞剛營造 89.12.12 發包 90.8.31 竣工
84		昇平國中	✓				89.11.21 流標 89.12.19 流標 90.1.5 決標	黃德介建築師；佑鎮營造 90.1.5 發包 90.9.14 竣工
85		大埔國中	✓				89.11.9 流標 89.11.24 流標 89.12.19 決標	黃德介建築師；鴻華營造 89.12.19 發包 90.8.31 竣工
86		景山國小 振寮分校	✓				89.11.8 流標 89.11.24 流標 90.1.5 決標	蔡明宏建築師；冠榮營造 90.1.5 發包 90.9.10 竣工

九二一校園重建								
(C 組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
87		新塢國小	✓				89.10.27 決標	蔡明宏建築師；日升鴻營造 89.10.27 發包 90.5.5 竣工
88		美林國小	✓				89.10.20 流標 90.11.8 決標	郭文雄建築師；權威營造 90.11.8 發包 90.8.27 竣工
89		港墘國小	✓				89.9.29 決標	蔡明宏建築師；賢興營造 89.9.29 發包 90.4.22 竣工
90	嘉義縣	後塘國小	✓				89.11.2 決標	蔡明宏建築師；超進營造 89.11.2 發包 90.8.23 竣工
91		中埔國小	✓				89.11.24 流標 89.12.22 流標 90.1.19 決標	陳資雲建築師；鼎上營造 90.1.19 發包 90.8.27 竣工
92		大有國小	✓				89.11.16 流標 89.12.19 決標	黃德介建築師；榮群營造 89.12.19 發包 90.7.15 竣工
93		三層國小	✓				89.9.29 決標	蔡明宏建築師；文聰土木營造 89.9.29 發包 90.3.1 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
94		中崙國小				✓	位於斷層，經專家評估不宜原地重建，另覓兩校地4/23經濟部中央地質調查所亦函知不宜建校。	90.7.6 地方人士已提供兩塊校地，經縣政府完成地籍圖座標後送經濟部地質調查所進一步勘察有無斷層。結果確定位於斷層帶上。現已另為覓地，學生則暫時安置鄰近的沄水國小，並由縣府補助每月交通費及保險費。近期將召開重建工程相關事宜協商會議，協商是否於原校地搭建小木屋方式進行重建校舍，將邀請相關單位參加。
95		社口國小	✓				89.11.30 決標	翁壽生建築師；力向營造89.11.30 發包90.9.12 竣工
96		中正國小	✓				89.10.20 流標 89.11.10 流標 89.12.19 流標 90.1.5 決標	呂宗修建築師；日發營造90.1.5 發包90.5.6 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
97		民和國小	✓				89.11.30 流標 90.1.5 決標	蔡明宏建築師；晉昇營造 90.1.5 發包 90.8.27 竣工
98		大湖國小	✓				89.11.16 決標	黃德介建築師；晉昇營造 89.11.16 發包 90.6.20 竣工
99		永興國小	✓				89.11.10 決標	蔡明宏建築師；安鴻營造 89.11.10 發包 90.8.14 竣工
100		文光國小	✓				89.11.30 決標	翁壽生建築師；興佳營造 89.11.30 發包 90.8.20 竣工
101		龍山國小	✓				89.11.25 決標	吳毓昌建築師；全成營造 89.11.25 發包 90.8.31 竣工
102		內埔國小	✓				89.11.21 流標 89.12.19 決標	吳德揚建築師；允信營造 89.12.19 發包 90.8.31 竣工
103		梅山國小	✓				89.11.30 流標 89.12.22 決標	黃德介建築師；益將營造 89.12.22 發包 90.8.24 竣工
104	嘉義縣	太平國小	✓				89.11.24 流標 89.12.12 流標 89.12.27 流標 90.1.17 決標	呂宗修建築師；合鍵營造 90.1.17 發包 90.8.24 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
105		太興國小	✓				90.1.17 決標	林明仕建築師；萬田營造 90.1.17 發包 90.11.22 竣工
106		來吉國小			✓		90.3.8 決標	吳毓昌建築師；冠榮營造 90.3.8 發包 91.5.19 竣工
107		豐山國小			✓		89.12.30 流標 90.3.22 決標	趙文蔚建築師；長陞營造 90.3.22 發包 91.3.31 竣工
108	台南縣	將軍國小			✓		89.12.2 流標 90.1.9 流標 90.2.20 流標 90.3.13 流標 90.3.29 決標	顏育炫建築師；丞億營造 90.3.29 發包 91.3.5 竣工
109	台中市	雙十國中			✓		90.2.14 流標 90.3.23 流標 90.4.23 決標	楊政忠建築師；鈺通營造 90.3.23 發包 91.1.31 竣工
110		崇倫國中			✓		89.12.22 流標 90.2.1 流標 90.2.20 流標 90.3.28 流標 90.4.24 決標	蕭淵暉建築師；子仁營造 90.4.24 發包 91.1.31 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
111		東峰國中	✓				88.10.21 決標	謝宗憲建築師；富捷營造 88.10.21 發包 89.3.15 竣工
112		五權國中	✓				89.8.22 決標	廖宜洲建築師；肯作營造 89.8.22 發包 90.3.7 竣工
113		東山國中	✓				89.6.17 流標 89.7.17 決標	王文芳建築師；金鋒營造 89.7.17 發包 90.9.30 竣工
114		台中國小	✓				89.8.29 流標 89.9.13 決標	曾文吉建築師；喬恆營造 89.9.13 發包 90.6.28 竣工
115		成功國小	✓				89.12.13 流標 89.12.30 流標 90.1.19 決標	總太建築師；謝其安營造 90.1.19 發包 90.6.29 竣工
116		進德國小	✓				90.2.14 保留 決標 90.2.26 核准 決標	許煌麟建築師；利富營造 90.2.26 發包 90.12.31 竣工
117	台中市	力行國小	✓				90.2.2 決標	徐明江建築師；鼎虹營造 90.2.2 發包 90.6.30 竣工
118 ※		樂業國小			✓		90.2.13 流標 90.4.3 流標 90.5.3 決標	邱坤成建築師；財園營造 90.5.3 發包 91.3.31 竣工

九二一校園重建								
(C組) 地方政府及學校自辦重建組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、已(預定)竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
119		忠孝國小	✓				89.10.20 決標	楊政忠建築師；展華營造 89.10.20 發包 90.3.20 竣工
120		大同國小	✓				90.2.20 決標	陳旻彬建築師；議建營造 90.2.20 發包 90.12.31 竣工
121		軍功國小	✓				89.6.2 流標 89.8.4 流標 89.8.22 決標	趙文弘建築師；勝緯營造 89.8.22 發包 90.8.25 竣工
122		新興國小	✓				88.10.26 決標	陳仲偉建築師；洪揚營造 88.10.26 發包 89.8.30 竣工
		合計	102 校		17 校	3 校		

表-16 民間認養自辦重建部分明細表

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
1	苗栗縣	內灣國小	✓				89.4.30 決標	中華開發公司；陳朝舜建築師；力甲營造已於 89.4.30 發包、89.11.24 竣工
2		景山國小	✓				89.5.9 決標	中華開發公司；陳朝舜建築師；力甲營造已於 89.5.9 發包、90.8.31 竣工
3		梅園國小			✓		90.1.10 決標	天主教明愛會等；黃孟偉建築師；龍群營造已於 90.1.10 發包、預定 91.2.28 竣工
4	台中縣	豐東國中	✓				89.5.21 決標	慈濟功德會；杜國源建築師；興亞營造已於 89.5.21 發包、90.6.30 竣工
5		光復國中	✓				89.12.27 流標 90.1.10 決標	TVBS 關懷基金會；沈祖海建築師；三普營造已於 90.1.10 發包、91.1.11 竣工
6		大里國中	✓				89.9.10 決標	慈濟功德會；黃建興建築師；益輝營造已於 89.9.10 發包、90.6.30 竣工

九二一校園重建								
(D組)民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
7		太平國中			✓		89.11.30 流標 90.6.22 決標	慈濟功德會；沈芷蓀建築師；利晉營造已於 90.6.22 發包、預定 91.6.30 竣工
8		中平國中	✓				89.9.19 決標	中時報系、台灣諾基；李永崇建築師；達欣營造已於 89.9.19 發包、90.8.31 竣工
9		東勢國中			✓		89.8.19 決標	慈濟功德會；朱鴻章建築師；啟阜營造已於 89.8.19 發包、預定 91.1.31 竣工
10		東勢國小	✓				89.7.31 決標	慈濟功德會；曾啟川建築師；新亞建設已於 89.7.31 發包、已於 90.10.31 竣工
11		中山國小	✓				89.7.15 決標	長榮集團；陳貞彥建築師；長鴻營造已於 89.7.15 發包、90.8.17 竣工
12		中科國小	✓				89.6.7 決標	佛光山文教基金會；陳永興建築師；力信營造已於 89.6.7 發包、90.6.16 竣工

九二一校園重建

(D組) 民間認養自(委)辦組

編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
13	台中縣	石岡國小	✓				89.7.31 決標	慈濟功德會；吳金福建築師；新圖成營造已於 89.7.31 發包、90.8.20 竣工
14		新社國小	✓				89.6.2 決標	慈濟功德會；潘怡群建築師；潤泰營造已於 89.6.2 發包、90.1.10 竣工
15		協成國小	✓				89.6.14 決標	台塑關係企業；廖進雄建築師；友力、領開營造已於 89.6.14 發包、90.6.15 竣工
16		塗城國小	✓				89.7.15 決標	慈濟基金會；許常吉建築師；啟阜營造已於 89.7.15 發包、90.12.15 竣工
17		瑞城國小	✓				89.9.10 決標	慈濟功德會；黃建興建築師；泰有營造已於 89.9.10 發包、90.8.15 竣工
18		健民國小	✓				90.3.5 決標	日本兵庫縣；王泰貴建築師；久川營造已於 90.3.5 發包、已於 90.12.3 竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
19		霧峰國小	✓				89.9.30 流標 89.10.4 決標	慈濟功德會；何友峰建築師；利晉營造已於 89.10.4 發包、90.9.15 竣工
20		僑榮國小			✓		90.4.24 決標	慈濟援建；吳省斯建築師；益輝營造已於 90.4.24 發包、預定 91.2.28 竣工
21		五福國小	✓				89.7.15 決標	慈濟功德會；何友峰建築師；北昌營造已於 89.7.15 發包、90.5.30 竣工
22		峰谷國小	✓				89.9.19 決標	中時報系、淡水一信；黃文杰建築師；強鼎營造已於 89.9.19 發包、90.4.30 竣工
23		桐林國小	✓				89.7.31 決標	紅十字會；黃建興建築師；勝新營造已於 89.7.31 發包、90.8.15 竣工
24		太平國小	✓				89.10.28 流標 89.11.27 決標	台灣電視公司；朱鴻章建築師；信榮營造已於 89.11.27 發包、90.10.27 竣工

九二一校園重建							
(D組) 民間認養自(委)辦組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
25	台中縣	宜欣國小	✓				88.12.1 決標 泰山文化基金會；林坤翰建築師；啟阜營造已於88.12.1 發包、89.4.26 竣工
26		坪林國小 坪部分校	✓				89.6.23 決標 周明德先生；呂欽文建築師；金大順營造已於89.6.23 發包、90.1.30 竣工
27		中山幼兒 實驗學校			✓		91.1.8 決標 鴻範工程顧問公司、工商營造 91.1.8 發包、預計91.8.31 竣工
28		光復國小			✓		90.3.16 決標 沈祖海建築師；三普營造已於90.1.16 發包、預定91.7.15 竣工
29	南投縣	南投國中			✓		89.11.30 決標 聯合報、中廣、中視；林昭喜建築師；新亞建設已於89.11.30 發包、預定91.3.31 竣工
30		中興國中	✓				89.5.10 決標 慈濟功德會；郭書勝建築師；太子建設已於89.5.10 發包、90.6.20 竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
31		埔里國中	✓				89.06.30 決標	慈濟功德會；新雄建築師事務所；泰有營造已於89.6.30發包、90.9.30竣工
32		大成國中	✓				89.05.31 決標	慈濟功德會；丁達民建築師；承隆營造已於89.5.31發包、91.1.15竣工
33		旭光國中	✓				89.10.24 決標	慈濟功德會；沈祖海建築師；新亞建設已於89.10.24發包、90.9.15竣工
34		社寮國中	✓				89.5.21 決標	慈濟功德會；張文明建築師；新亞建設已於89.5.21發包、90.4.29竣工
35		集集國中	✓				89.5.21 決標	慈濟功德會；兆仁喜建築師；新亞建設已於89.5.21發包、90.6.30竣工
36		名間國中	✓				89.10.5 決標	台北市扶輪社、新光人壽；郭俊沛建築師；基泰營造已於89.10.5發包、90.3.15竣工

九二一校園重建								
(D組)民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
37		瑞峰國中	✓				89.9.01 決標	TVBS 關懷基金會；呂煥章建築師；松輝營造已於89.9.1發包、90.5.22竣工
38	南投縣	中寮國中	✓				89.5.25 決標	慈濟功德會；江之豪建築師；新亞建設已於89.5.25發包、90.5.3竣工
39		爽文國中	✓				89.5.25 決標	慈濟功德會；姚元喜建築師；新亞建設已於89.5.25發包、90.4.6竣工
40		國姓國中	✓				89.10.24 流標 89.12.05 決標	台灣電視公司；合院聯合建築師事務所；順鼎營造已於89.12.5發包、90.12.20竣工
41		北梅國中	✓				89.6.20 決標	TVBS 關懷基金會；沈祖海建築師；長聯營造已於89.6.20發包、90.7.19竣工
42		水里國中	✓				89.6.25 決標	長榮集團；陳貞彥建築師；長鴻營造已於89.6.25發包、90.6.4竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
43		信義國中	✓				89.4.08 決標	富邦慈善基金會；台北華業建築師事務所；互利營造已於 89.4.8 發包、89.12 竣工
44		南投國小	✓				89.8.10 決標	慈濟功德會、新光人壽；許常吉建築師；長家營造已於 89.8.10 發包、90.9.30 竣工
45		平和國小	✓				台塑認養部分已經竣工，慈濟於 89.8.03 發包	台塑營建部；領開營造；目前係校舍汰舊建新，慈濟部分預定 91.5 竣工
46		新豐國小	✓				89.5 決標	遠東關係企業；宗邁建築師事務所；遠揚營造已於 89.5 發包、90.5.8 竣工
47		漳和國小	✓				89.6.30 決標	紅十字會；姚仁熹建築師；力拓營造已於 89.6.30 發包、90.8.4 竣工
48		埔里國小	✓				90.6.15 決標	慈濟功德會；陳明雄建築師；興亞營造已於 89.6.15 發包、90.8.4 竣工

九二一校園重建								
(D組)民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
49		桃源國小			✓		90.6.28 決標	慈濟功德會；黃建興建築師；信榮營造已於 90.6.28 發包、預定 91.3.1 竣工
50		中峰國小			✓		90.6.28 決標	慈濟功德會；金瑞涵、邱文傑建築師；利晉營造已於 90.6.28 發包、預定 91.7.15 竣工
51		大成國小	✓				89.9.30 決標	慈濟功德會；丁達民建築師；承隆營造已於 89.9.30 發包、90.12.20 竣工
52	南投縣	草屯國小	✓				89.10.6 決標	自由時報；張國章建築師；助群營造已於 89.10.6 發包、89.12 竣工
53		炎峰國小			✓		90.11.23 決標	慈濟功德會；沈芷蓀建築師；力拓營造已於 90.11.23 發包、預定 91.11.30 竣工
54		中原國小	✓				89.11.17 決標	東培公司、慈濟功德會；杜國源建築師；新亞建設已於 89.11.17 發包、90.12.31 竣工

九二一校園重建								
(D組)民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
55		平林國小	✓				89.5.31 決標	佛光山文教基金會；何肇喜建築師；長益營造已於89.5.31發包、90.6.17竣工
56		僑光國小	✓				89.9.10 決標	高雄縣政府；謝舒惠建築師；新亞建設已於89.9.10發包、90.12.20竣工
57		竹山國小	✓				89.5.21 決標	慈濟功德會；許常吉建築師；長家營造已於89.5.21發包、90.9.30竣工
58		延平國小	✓				89.5.21 決標	慈濟功德會；張文明建築師；新亞建設已於89.5.21發包、90.5.4竣工
59		社寮國小	✓				89.6.23 決標	紅十字會；林怡君建築師；新亞建設已於89.6.23發包、90.4.29竣工
60		中州國小	✓				90.3.21 決標	慈濟援建；張文明建築師；新亞建設已於90.3.21發包、90.12.27竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
61		集集國小	✓				89.5.21 決標	慈濟功德會；太元建築師事務所；新亞建設已於89.5.21 發包、90.3.26 竣工
62		永昌國小	✓				88.12.27 開工	國際獅子會；郭榮煌建築師；隆大營造已於89.12.30 發包、89.4 竣工
63		富山國小	✓				修繕工程	台灣愛普生科技；劉進忠建築師；元吉昌營造已於89.8.25 發包、89.10 竣工
64		鹿谷國小	✓				89.8.10 決標	紅十字會；賴榮俊建築師；祥龍營造已於89.8.10 發包、90.6.30 竣工
65	南投縣	瑞田國小	✓				89.10.20 決標	國際獅子會；陳明城建築師；寶灝營造已於89.10.20 發包、89.12.31 竣工
66		中寮國小	✓				89.3.10 決標	TVBS 關懷基金會；沈祖海建築師事務所；長聯營造已於89.3.10 發包、90.1.30 竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
67		爽文國小	✓				89.6.30 決標	佛光山文教基金會；賴榮俊、陳惠民建築師；福邑、基源營造已於89.6.30 發包、90.6.17 竣工
68		永樂國小	✓				89.1.20 決標	金車教育基金會；黃啟煌建築師；寶鼎營造已於89.1.20 發包、89.9.20 竣工
69		至誠國小	✓				89.5.25 決標	慈濟功德會；黃建興建築師；新亞建設已於89.5.25 發包、90.3.25 竣工
70		廣福國小	✓				89.5.19 決標	一貫道天惠道德基金會；直僅建築師事務所；凡榮營造已於89.5.19 發包、90.7.1 竣工
71		魚池國小	✓				89.6.27 決標	中時報系、華新、華邦；廖澤民建築師；全能營造已於89.6.27 發包、90.6.23 竣工
72		東光國小	✓				89.5.31 決標	慈濟功德會；黃建興建築師；承隆營造已於89.5.31 發包、90.6.30 竣工

九二一校園重建								
(D組)民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
73		國姓國小			✓		89.10.13 決標	台灣電視公司；蔡元良建築師；順鼎營造已於89.10.13發包、預定91.1.31竣工
74		北山國小	✓				89.8.10 決標	紅十字會；吳瑞楨建築師；順鼎營造已於89.8.10發包、90.8.31竣工
75		北港國小	✓				89.7.01 決標	台灣電視公司；郭書勝建築師；承隆營造已於89.7.1發包、90.11.15竣工
76		福龜國小	✓				89.7.15 決標	慈濟功德會；黃建興建築師；北昌營造已於89.7.15發包、90.6.30竣工
77		育樂國小	✓				89.5.16 決標	靈鷲山佛教基金會；蔡博文建築師；昭雄營造已於89.5.16發包、90.3.24竣工
78	南投縣	長福國小	✓				89.7.25 決標	游標榮先生；施純誠建築師；朝陽營造已於89.7.25發包、89.12竣工

九二一校園重建							
(D組) 民間認養自(委)辦組							
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否	
79		乾峰國小	✓				89.5.16 決標 TVBS 關懷基金會；呂煥章建築師；松暉營造已於89.5.16發包、90.1竣工
80		水里國小	✓				89.8.17 決標 中國石油公司；莊耀山建築師；淳哲營造已於89.8.17發包、90.8.15竣工
81		玉峰國小	✓				89.3.21 決標 國際獅子會；賴榮俊建築師；永豪營造已於89.3.21發包、89.12竣工
82		永興國小	✓				89.12.12 決標 基礎道德文化教育基金會；張文雄建築師；松暉營造已於89.12.12發包、90.12.31竣工
83		信義國小	✓				修繕工程 中時報系、銖德科技；春輝營造已於89.3.28開工、89.5竣工
84		人和國小	✓				89.1.31 決標 富邦慈善基金會；華業建築師事務所；互利營造已於89.1.31發包、89.9竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
85		地利國小	✓				89.2.12 決標	富邦慈善基金會華業建築師事務所；互利營造已於89.2.12發包、89.9竣工
86		潭南國小	✓				89.7.01 決標	浩然基金會；姜樂靜建築師事務所；欣祥營造已於89.7.1發包、90.10.5竣工
87		新鄉國小	✓				修繕工程	金車教育基金會；陳永川建築師事務所；佶環營造已於90.2.26開工、90.3竣工
88		萬豐國小	✓				89.7.01 決標	台塑關係企業；台塑建築設計、台塑營建部營造已於89.7.1發包、90.8.20竣工
89	雲林縣	古坑國中	✓				89.7.1 決標	長榮集團；陳貞孝建築師；長鴻營造已於89.7.1發包、90.8.8竣工
90		梅林國小	✓				89.6.20 決標	一貫道中一堂等；直僅建築師事務所；凡榮營造已於89.6.20發包、90.7.7竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
91		古坑國小	✓				89.7.26 決標	中時報系、宜和洋行；張樞建築師；長鴻營造已於89.7.26 發包、90.4.15 竣工
92		永光國小	✓				89.4.8 決標	台塑關係企業；蕭證文建築師；友力營造已於89.4.8 發包、90.4.10 竣工
93		九芎國小	✓				89.4.21 決標	台塑關係企業；楊尚衡建築師；鼎台營造已於89.4.21 發包、90.2.1 竣工
94		台西國小	✓				89.4.1 決標	台塑關係企業；賴碧華建築師；上官、榮信營造已於89.4.1 發包、90.4.20 竣工
95		臺興國小	✓				89.4.1 決標	台塑關係企業；林木榮建築師；松暉營造已於89.4.1 發包、90.1.20 竣工
96	嘉義縣	大吉國中	✓				89.8.10 決標	慈濟功德會；郭書勝建築師；永達營造已於89.8.10 發包、90.8.31 竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
97		民和國中	✓				89.6.15 決標	慈濟功德會；劉瑞豐建築師；啟阜營造已於 89.6.15 發包、90.5.31 竣工
98		朴子國小	✓				89.5.26 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；友力營造已於 89.5.26 發包、90.4.15 竣工
99		興中國小	✓				89.5.25 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；鈺通營造已於 89.5.25 發包、90.3.31 竣工
100		文昌國小	✓				89.4.24 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；友力營造已於 89.4.24 發包、90.3.21 竣工
101		月眉國小	✓				89.3.25 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；力騰營造已於 89.3.25 發包、89.12.31 竣工
102		太保國小	✓				89.5.25 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；友力、冠林營造已於 89.5.25 開工、90.3 竣工

九二一校園重建								
(D組)民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
103		安東國小	✓				89.4.1 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；胡發營造已於 89.4.1 開工、89.11 竣工
104		南新國小	✓				89.5.30 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；東里、偉淳營造已於 89.5.30 開工、90.3.31 竣工
105	嘉義縣	新埤國小	✓				89.5.15 決標	台塑關係企業吳毓昌建築師；鈺通營造已於 89.5.15 開工、89.12.31 竣工
106		成功國小	✓				89.4.29 決標	台塑關係企業；吳毓昌建築師；友力營造已於 89.4.29 發包、90.1.25 竣工
107		圓崇國小	✓				89.12.18 決標	宗倬章先生教育基金會；陳柏森建築師；鈺通營造已於 89.12.18 發包、已於 90.10.4 竣工

九二一校園重建								
(D組) 民間認養自(委)辦組								
編號	縣市	學校名稱	竣工與否		發包與否		流標情形或未發包原因	已發包日期、預定竣工日期或因應對策
			是	否	是	否		
108	嘉義市	北園國小	✓				89.12.18 決標	宗偉章教育基金會；陳柏森建築師；鈺通營造已於89.12.18發包、已於90.10.31竣工
		合計	97校		11校	0校		
