

# 莫拉克災後重建耀動計畫— 原住民永久屋基地產業發展計畫執行進度

報告單位： 行政院原住民族委員會

報告日期：102年6月26日

# 簡報大綱

- 各基地產銷館發展目標
- 計畫整體進度
- 各基地產銷館開館營運期程
- 駐館人力運用情形
- 產銷館開館系列活動配套措施
- 在地組織籌組狀況
- 補助在地組織經費運用規劃
- 目前遭遇困難
- 控管機制

# 各基地產銷館發展目標

縣市	基地名稱	發展目標
嘉義縣	轆仔腳第3期基地	透過聚會所、文化觀光藝術館、活動中心建置，發展為大阿里山地區觀光產業中心
高雄市	杉林大愛園區	以發展多元文化特色部落為目標，未來兩年將推動型塑特色產品包裝及行銷通路推廣相關工作
屏東縣	長治百合園區	以發展與原鄉串聯之香草轉運站為目標，未來兩年將推動地方特色農產業發展計畫相關工作
	禮納里部落	以發展工藝營造的「內發型」藝術社區為目標，未來兩年將推動多角化社區工藝扶植相關工作
	吾拉魯滋部落	以發展「咖啡飄香，樂音飄揚」的樂活社區為目標，未來兩年將推動文化觀光定目劇等相關工作
	新來義部落	以發展排灣族文化體驗中繼站為目標，未來兩年將推動工藝文創及農特產展售相關工作
臺東縣	嘉蘭社區	以發展洛神花、小米溫泉觀光產業為目標

# 計畫整體進度2-1

102年5月

- 本會及各縣市政府完成專管中心及經營輔導團隊委託作業

102年6月

- 本會專管中心(嘉義大學)完成永久屋基地期初訪視並提交評估報告

102年9月

- 各永久屋基地至少辦理1-2場次人才培訓
- 搭配相關節慶辦理行銷活動

# 計畫整體進度2-2

102年12月

- 協助挖掘產業計畫至少15件
- 各永久屋基地產業館(場)開館營運


103年3月

- 協助開發特色文創商品
- 協調辦理永久屋基地系列專題報導

103年6月

- 協助挖掘產業計畫至少30件
- 協助永久屋基地規劃永續經營策略

# 各基地產銷館開館營運期程

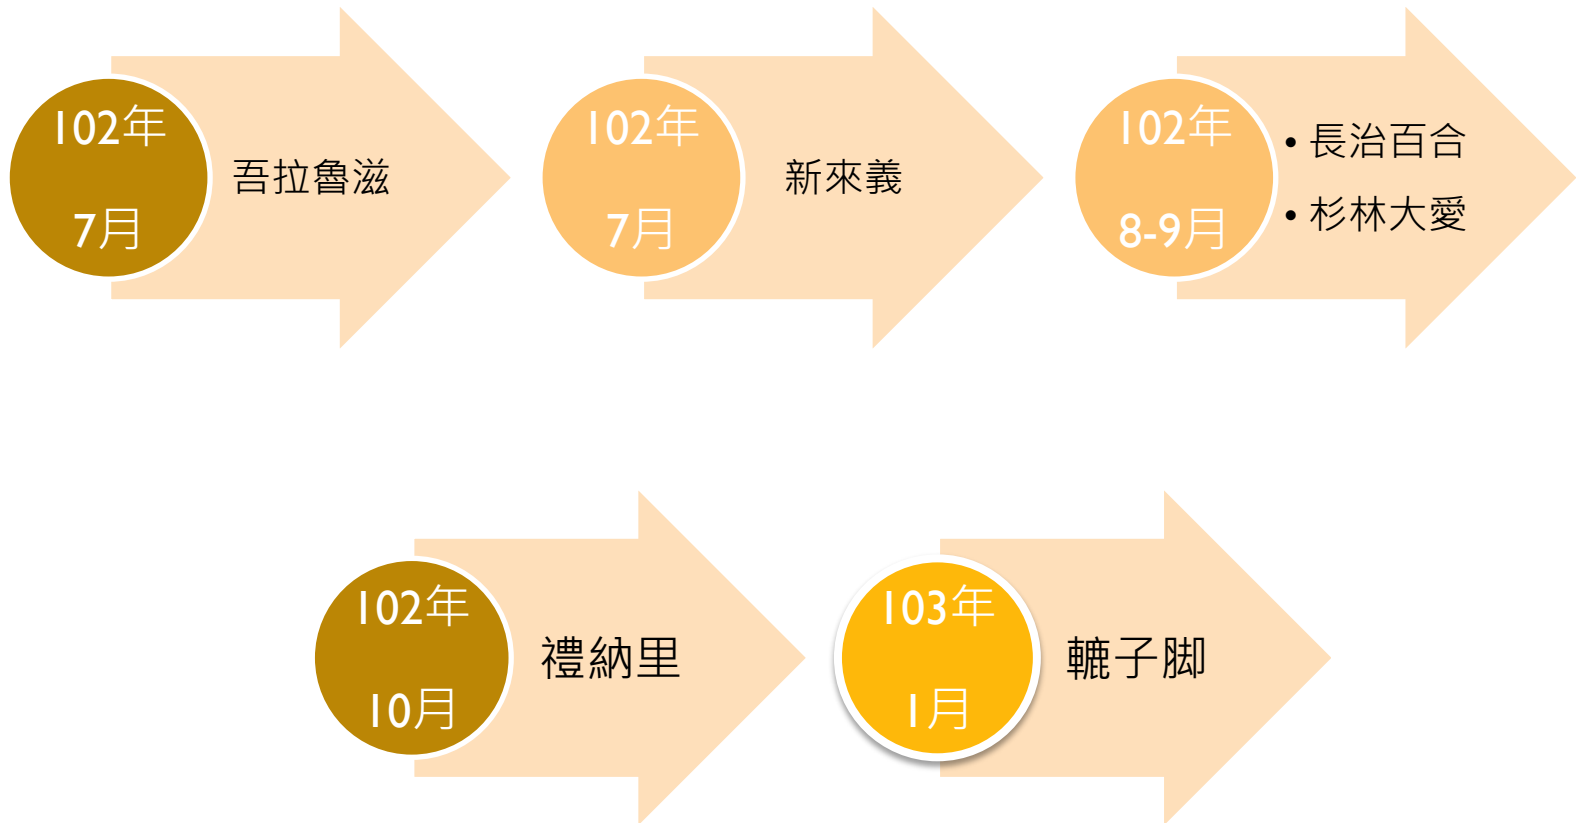

# 駐館人力運用情形

基地名稱	工作地點	實際居住地	備註
轆仔脚 第3期基地	逐鹿社區活動中心	嘉義縣中埔鄉	
杉林 大愛園區	基地內臨時辦公室	杉林區月眉里	-
長治百合 園區	產銷館	長治百合阿禮部落 長治百合吉露部落	-
禮納里部落	展望會好茶服務站	霧台鄉好茶村	因產銷館施工中， 借用展望會場地 辦公。
吾拉魯滋 部落	泰武鄉公所農觀課	泰武鄉泰武村	駐館人力每週駐 館2日。
新來義部落	產銷中心	新來義部落義林村	-
嘉蘭社區	-	-	基地無產業館場。

# 產銷館開館系列活動配套措施

- 1.各縣市政府配合相關節慶或祭典，辦理行銷活動，所需費用由本會補助經費支應。
- 2.本會專管中心搭配行銷活動邀請媒體宣傳。
- 3.本會專管中心規劃辦理永久屋系列專題報導。



# 在地組織籌組狀況

基地名稱	目前狀況	預定完成時程
轆仔脚 第3期基地	規劃籌組社區型合作社，並業向嘉義縣政府社會局提出申請。	預計10月底完成。
杉林 大愛園區	分輕食服務、樂舞展演、文化體驗、導覽4組委託4個在地組織負責營運規劃。	6/3已完成4組經營團隊甄選。
長治百合 園區	籌組跨部落共16人之產業發展組織，並申請設立協會中。	未定，持續追蹤中。
禮納里部落	分陶藝、金石皮雕、刺繡編織、木石鐵雕4大工坊為營運主軸，預定於6月下旬召開工坊說明會，透過推舉機制選擇各工坊經營團隊，且皆需由3個部落人員共同參與。	預計6月底完成。
吾拉魯滋 部落	已成立有限責任屏東縣原住民泰武咖啡生產合作社，負責產業館營運。	已完成。
新來義部落	公所業協同產業經營輔導團隊訂定「產銷中心經營管理單位申請辦法」，由在地組織於6月28日前提出申請，透過評選機制遴選適當之經營團隊。	預定7月初完成。
嘉蘭社區	尚待研議。	

# 補助在地組織經費運用規劃

基地名稱	分配經費/總經費 (單位：萬元)	支用規劃
轆仔脚 第3期基地	179 / 350	在地經理人薪資、場館營運、展售活動。
杉林 大愛園區	180 / 800	訂定補助規範，供在地組織依產業館 4 大營運方向提出申請，遴選符合資格者補助其運作經費。
長治百合 園區	90 / 400	補助 6 個在地組織辦理產業相關活動。
禮納里部落	80 / 450	由在地組織提出營運計畫向縣府申請，計畫須符合產業環境改善、產業組織發展、行銷經營、特色產品研發等事項。
吾拉魯滋 部落	30 / 250	由在地組織提報計畫向公所申請，計畫以辦理產業活動為主軸。
新來義部落	60 / 400	由在地組織提報計畫向公所申請，計畫以提升居民生活品質，達到提升經濟發展與文化傳承為目的。
嘉蘭社區	150 / 350	( 產業經營輔導團隊由在地組織承攬。 )

# 目前遭遇困難

- ▶ 部分縣市政府規劃產業館建築主體時，未依本會審查意見將建築物內部所需各項設備併同規劃，至部分產業館目前無充足經費購置完整內裝設備，在經費有限情形下，建議各縣市政府就現有的設施先行營運。
- ▶ 台東縣政府委託之經營輔導團隊，未能提出具體經營策略，本會將責成嘉義大學積極介入輔導，以協助其確立目標。

# 控管機制

- 本會將函請各縣市政府就在地組織運作（含人才培育）、產業館經營、特色商品開發、產業行銷活動及退場機制等面向擬訂控管表。
- 本會專管中心每月實地訪視，依各縣市所提執行期程控管進度。
- 未達預定進度之縣市政府，本會暫緩撥付計畫經費。

簡報結束  
敬請指正



行政院原住民族委員會  
COUNCIL OF INDIGENOUS PEOPLES, EXECUTIVE YUAN
